




		Lot GO (gros œuvre / CM / bardage)				Lot GO - volet VRD / espaces verts				MOA / MOE		Commun GO + SPK				SPK + MOA (mesures compensatoires)		
Lot	S1 02/11	S2 09/11	S3 16/11	S4 23/11	S5 30/11	S6 07/12	S7 14/12	S8 21/12	S9 28/12	S10 04/01	S11 11/01	S12 18/01	S13 25/01	S14 01/02	S15 08/02	S16 15/02		
GO							[GO] Couche de forme + sablon d'égalisation + film polyéthylène (1 j)											
GO + SPK								[GO] Pose et incorporation de la tuyauterie d'aspiration DN300 sous radier (fournie SPK) + validation implanta... (1 j)										
GO								[GO] Drain périphérique / gestion des eaux autour du radier (si G2PRO l'impose) (1 j)										
GO								[GO] Ferrailage radier (TS + HA), attentes pieux, réservations, fourreaux, coffrage de rives et bêches périph... (4 j)										
GO								[GO] Coulage du radier béton C25/30 XC2 XF1 (parement soigné, circulations brossées antidérapantes) (1 j)										
GO								[GO] Durcissement du radier avant chargement de la cuve (délai à valider BET / bureau de contrôle) (7 j)										
								6. RÉSERVE D'EAU AÉRIENNE B2 (620 m³)										
SPK								[SPK] Livraison cuve + équipements sur site, réception, stockage (2 j)										
SPK								[SPK] Implantation cuve, pose cornière de fixation, contrôle planéité (1 j)										
SPK								[SPK] Montage cuve boulonnée Ø 12,48 m x H 5,74 m (6 j)										
SPK								[SPK] Pose feutre géotextile + poche PVC (garantie décennale) (2 j)										
SPK								[SPK] Toit autoportant galvanisé, échelle à crinoline, plateforme, trappe cadenassable (3 j)										
SPK								[SPK] Équipements : trop-plein DN150, vidange DN80, remplissage/retour essai DN150 disconnecté, aspiration DN3... (3 j)										
GO								[GO] Joint ciment périphérique autour de la cornière de fixation de la cuve (1 j)										
SPK								[SPK] Réseaux EU aériens : trop-plein et vidange (DN200), sorties à 1,00 m du nu cuve (1 j)										
SPK								[SPK] Clapet anti-pollution type EA sur arrivée eau de ville DN65 + vers EU + vanne de contre-barrage (1 j)										
SPK								[SPK] Remplissage de la cuve (<= 36 h) + test d'étanchéité (2 j)										
								7. RÉSEAUX ENTERRÉS / TRANCHÉES COMMUNES										
								7.1 Tranchée 1 - cuve B2 ↔ local source B2										
GO								[VRD] Ouverture tranchée commune (~ 25 ml estimés) (2 j)										
GO								[VRD] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local B2 / réserve d'eau) + chambre de tirage (1 j)										
SPK								[SPK] Pose aspiration fonte DN300 + remplissage/retour essai DN150 (butées béton, tiges filetées) de la cuve à... (3 j)										
SPK								[SPK] Épreuves hydrauliques des réseaux enterrés tranchée 1 (1 j)										
GO								[VRD] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 1 (95 % OPM) (2 j)										
								7.2 Tranchée 2 - local source B2 ↔ local GE / source A										
GO								[VRD] Ouverture tranchée commune (~ 60 ml estimés, sciage voirie lourde + espace vert) (3 j)										
GO								[VRD] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local GE / local B2) + chambre de tirage (1 j)										
SPK								[SPK] Pose refoulement fonte DN200 de la pièce de scellement B2 jusqu'au local GE (butées béton) (4 j)										
SPK								[SPK] Épreuves hydrauliques du refoulement enterré tranchée 2 (1 j)										
GO								[VRD] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 2 (3 j)										
								7.3 Tranchée 3 - EU (puisard trop-plein → regard existant)										
GO								[VRD] Tranchée + réseau de collecte extérieur EU PVC DN200 (puisard/vidange → regard existant), regard 500x500 (3 j)										
GO								[VRD] Raccordement sur réseau EU existant (branchement), boîte de branchement, reprise des sorties EU à 1,00 m (1 j)										
GO								[VRD] Remblaiement et compactage tranchée EU (1 j)										
								7.4 Électricité - réseaux enterrés										
SPK								[SPK] Réseau aérien + sortie fourreau à 1 m du nu bâtiment, câble TGBT → pénétration, câbles reports d'alarme ... (3 j)										
								8. LOCAL SOURCE B2 / LOCAL GE - SCELLEMENTS ET ÉQUIPEMENTS										
GO					</													

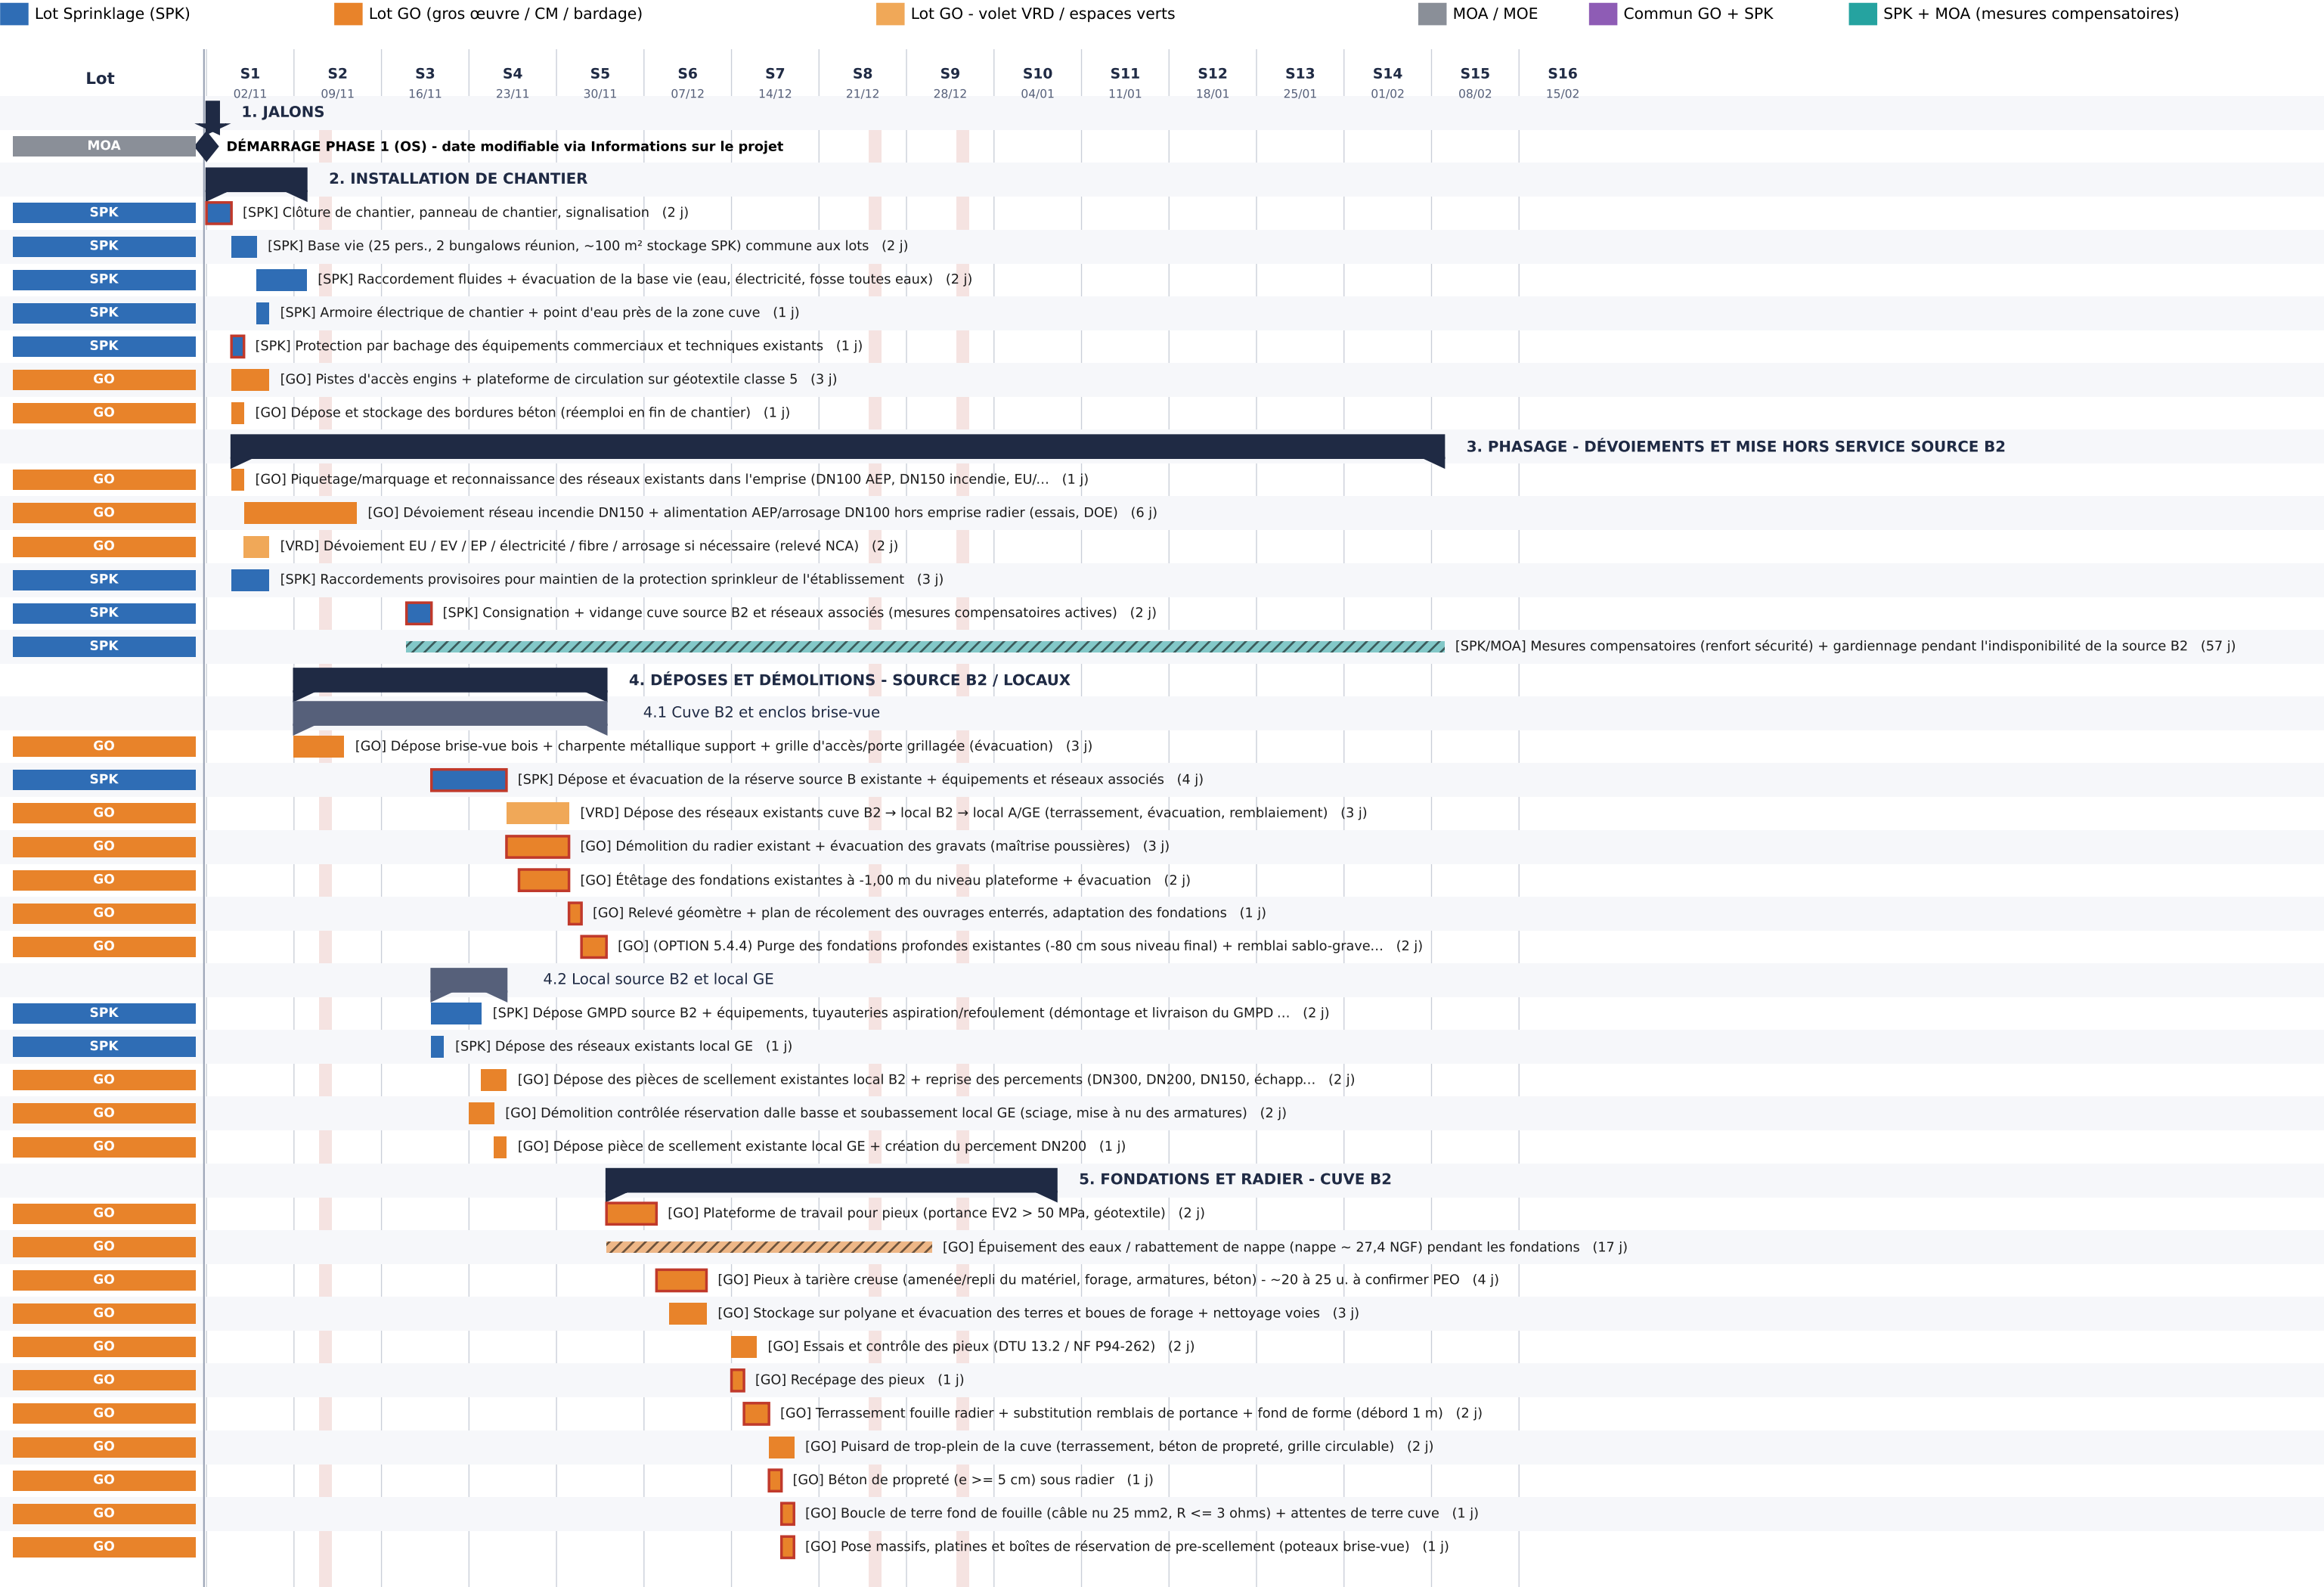
